

[Diagrama de Rede]

Sequencia as atividades e revela o caminho crítico

COMPLEMENTAR Modelo 18 · Planejamento · PMBOK: 6.3 Sequenciar as Atividades · CPM (6.5)

Depois das estimativas. Liste as atividades de modo que as predecessoras venham antes; o caminho crítico é a sequência com folga zero.

Manual de preenchimento: manual 18_diagrama_de_rede.pdf



Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)		Nome do projeto	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto		Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA			

Cadeia do projeto


Vem de 13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 17 Estimativa das Atividades

Alimenta 19 Cronograma do Projeto

🕸 Rede de atividades

ES	Duração	EF
Nome da atividade (código da EAP)		
LS	Folga	LF

ES/EF: início e término mais cedo (passagem de ida).
LS/LF: início e término mais tarde (passagem de volta).
Folga = $LS - ES$. Folga zero = **caminho crítico**.

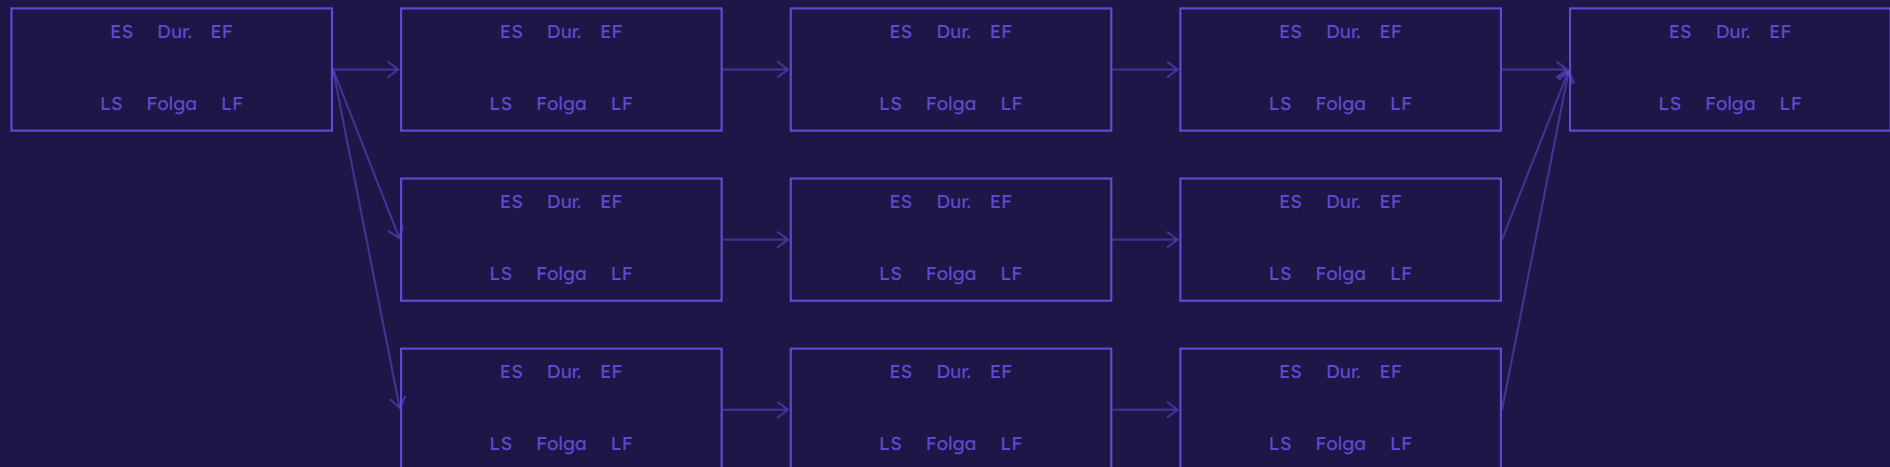

Esqueleto de exemplo: apague as setas que não existem no seu projeto e marque o caminho crítico em amarelo. A versão .xlsx calcula ES, EF, LS, LF e a folga sozinha.

Cálculo das datas e folgas

Colunas com *f* são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

for_code[]

#	Código	Atividade	Duração	Pred. 1	Pred. 2	Pred. 3	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítica?
	EAP (ex.: 1.1)		dias ou semanas	código	código	código						
1							f	f	f	f	f	f
2							f	f	f	f	f	f
3							f	f	f	f	f	f
4							f	f	f	f	f	f
5							f	f	f	f	f	f
6							f	f	f	f	f	f
7							f	f	f	f	f	f
8							f	f	f	f	f	f
9							f	f	f	f	f	f
10							f	f	f	f	f	f
11							f	f	f	f	f	f
12							f	f	f	f	f	f
13							f	f	f	f	f	f
14							f	f	f	f	f	f
15							f	f	f	f	f	f
16							f	f	f	f	f	f

for_code[]



Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou
